

RAPPORTAGE VISUELE INSPECTIE NA ASBESTVERWIJDERING

Burgemeester Fenemaplein 2
Zandvoort
Aanbouw Oostzijde



Projectnummer: 21.30019/1/1.1
Datum uitvoering: 20-3-2021
Inspecteur: [REDACTED]
Soort verrichting: Buitensanering
Geïnspecteerd gebied / ruimte: Luifel balkonzijde.
Opdrachtgever: [REDACTED]
Contactpersoon: [REDACTED]
Vestigingsadres: Postbus 16
Vestigingsplaats: Alphen a/d Rijn
Uw referentie: 658345
Datum rapportage: 22-3-2021

De verrichting is uitgevoerd conform NEN 2990; okt. 2012 en voor deze verrichting is ESI RvA-Inspectie geaccrediteerd onder nummer I-185. Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Project gegevens

Oppervlakte werkgebied	: 100 m ²	Verdiepingen in cont.	: Nee	
Werkplan ingezien	: Ja	Plaats inspectie	: Buiten	
Invt. rapport aanwezig	: Ja	Weersomstandigheden	: Droog	
Omgevingsvergunning	: Aanwezig	Soort ondergrond	: Verhard	
Saneringsklasse	: 2	Situatie werkplek	: Droog	
		Inspectietijd	: 14:45	15:10
Inventarisatie bureau	: MvM Asbestinventarisatie 20.0409 d.d 04-02-2021			

Verwijderde bronnen

Broncode	Verwijderd materiaal	Bevestigingswijze	Vezelsoort + gehalte	Hoeveelheid	HB
Bron 3	Plaatmateriaal	Geklemd	Chrysotiel (10 - 15)	30m2	Ja

Bijlagen

<input checked="" type="checkbox"/> Visuele inspectie	<input checked="" type="checkbox"/> Foto's
	<input checked="" type="checkbox"/> Schets

Resultaat

Visuele inspectie	: goedgekeurd
Luchtmeting	: n.v.t
Kleefmonsters	: n.v.t
Luchtmeting SEM	: n.v.t
Grondmonsters	: n.v.t

Eindconclusie

Op grond van bovenstaande bevindingen van de uitgevoerde inspectie kan worden geconcludeerd dat het geïnspecteerde gebied WEL voldoet aan de eisen zoals beschreven in art. 4.47b lid 2 van het arbeidsomstandighedenbesluit en dat het geïnspecteerde gebied WEL zonder gebruik van adembescherming mag worden betreden.

Bijlage visuele inspectie

Containment/afgezet gebied geschikt voor inspectie?	Ja
Werkzaamheden conform werkplan uitgevoerd?	Ja
Is de ruimte voldoende verlicht?	Ja
Is de ruimte droog?	Ja
Is de ruimte stofvrij?	Nvt
Is de vloer gefreesd?	Nvt
De aanwezige schroef/spijkergaten uitgeboord?	Nvt
Indien transitroute, voldoet deze aan criteria?	Nvt
Zijn alle asbesthoudende toepassingen verwijderd?	Ja
Ruimte/afgezet gebied vrij van obstakels of verpakt afval?	Ja
Zijn naden en kieren doorgehaald met een spatel?	Nvt
Afzetlint > 5m vanaf het object geplaatst?	Ja
Alle asbestcontact oppervlakken vrij van asbest restanten?	Ja
Indien de afzetting niet voldoet aan de 5 mtr, is buiten de afzetting geïnspecteerd en omschreven?	Nvt
Betreft het hier een RK2A met uitzondering binnen een containment?	Nvt
Is de debietmeting in de directe nabijheid van het containment uitgevoerd?	Nvt

Opmerkingen bij keuze nee :
Nvt.

Segment	1		2		3		4		5		6		7		8	
	aan	res	aan	res	aan	res	aan	res	aan	res	aan	res	aan	res	aan	res
Gaten, naden, kieren	Ja	+														
Toegangssluis / Deco	Ja	+														
Wanden, vloer, plafond	Ja	+														
Onderdrukmaschine	-	nvt														
Kabelgoten	-	nvt														
Schakelaars	-	nvt														
Lampen	-	nvt														
Doorvoeringen	-	nvt														
Rachelwerk	-	nvt														

Opmerkingen:

Er is conform het werkplan van de opdrachtgever gesaneerd.

Uitsluitingen:

Alles onder en achter het zichtbare oppervlak.

Alles buiten het geïnspecteerd gebied.

aan = aanwezig

res = resultaat

nvt = niet van toepassing

+2 = in orde na aanvullende schoonmaak

A = afgekeurd vanwege asbest resten, gehele ruimte opnieuw reinigen

segment = onderverdeling van opp. van het containment in separate inspectiedelen van max. 250 m2

- = niet aanwezig


NI = niet inspecteerbaar

af = afgeplakt/afgeschermd

+ = direct in orde bevonden

Bijlage situatie schetsen

BETREFT HIER EEN SCHEMATISCHE TEKENING EN IS NIET OP SCHAAF OF KAN AFWIJKEN VAN WERKELIJKHEID

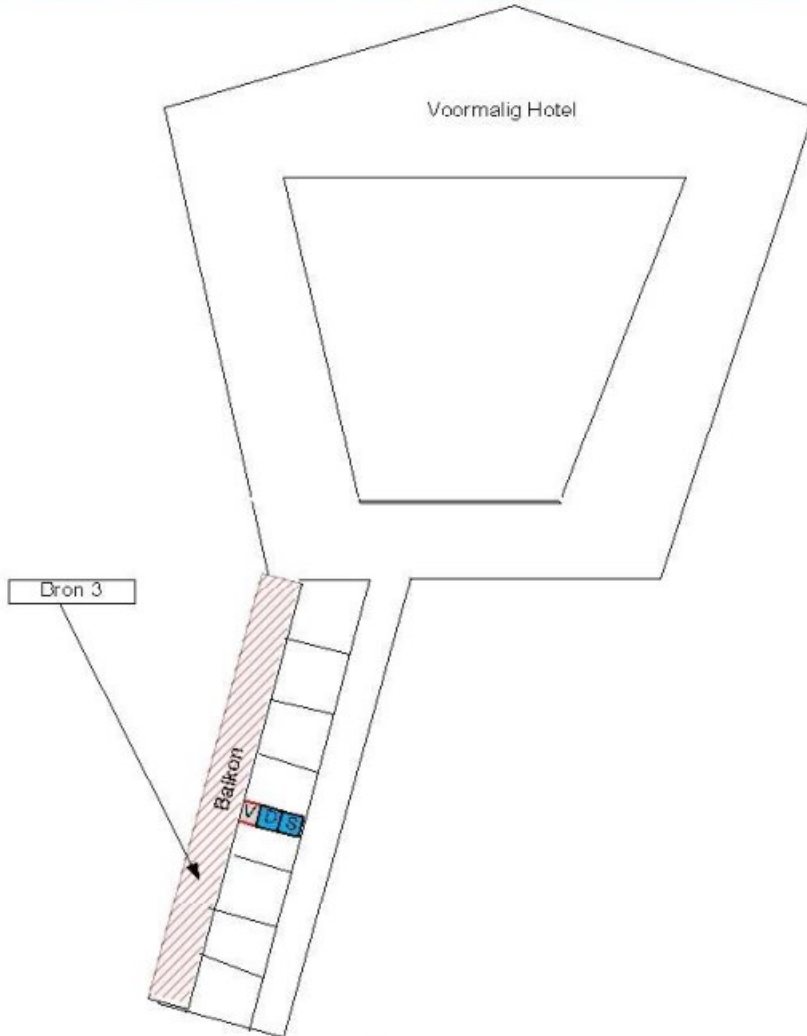

eurofins Sanitas Inspections		LEGENDA	
Saneringsbedrijf : Vlasman Inspecteur : M de Kluis Adres : Burgemeester Fenemapplein 2 Plaats : Zandvoort Referentie nummer : 658345 DT/Ver. : G Arupa Ruimte : Hotel		<ul style="list-style-type: none"> onderdruk deco Inspectiegebied afzetlint transit route 	<ul style="list-style-type: none"> X pomp/filter nr. ● kleefmonster nr. ▲ waarschuwbord A asbestbron
EXTRA TOOLS	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; background-color: #2196f3; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-size: 10px; margin-right: 5px;">flens (nr.)</div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; background-color: #ffeb3b; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-size: 10px; margin-right: 5px;">ca. mtr</div> </div> <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">← ca. mtr → Inspectiegebied bij niet voldoen aan de 5 mtr zone.</p>	AFMETING INSPECTIEGEBIED
		LENGTE : BREEDTE : HOOGTE :	

Opmerkingen



Bijlage foto's







